

## PLANO OPERATIVO ANUAL DE ATIVIDADES POA 2021

distrito@projetojaiba.com.br

### ÍNDICE - POA 2021

Página

1.	APRESENTAÇÃO	02
2.	PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR	
	2.1. Cenário da Fonte Hídrica do Projeto Jaíba - Rio São Francisco	02
	2.2. Ocupação	03
	2.3. Gráfico Volume Fornecido de Água para Irrigação	03
	2.4. Inadimplência	04
	2.5. Plano Operativo 2020 – Planejado X Realizado	06
	2.6. Manutenção da Infraestrutura de Uso Comum	07
	2.6.1. Manutenção Elétrica, Automação e Mecânica	
	2.6.2 Manutenção de Canais	
	2.6.2.1. Desassoreamento	10
	2.6.2.2. Roçagem de vegetação	11
	2.6.2.3. Recuperação de Juntas e Substituição de Placas	12
	2.6.2.4. Gleba D (Ações Controle Operacional Fornecimento de Água)	14
	2.6.2.5. Atividades Diversas de Manutenção civil	
	2.6.3. Manutenção de Comportas	
	2.6.4. Manutenção Predial	17
	2.6.5. Regularização de Estradas	19
	2.6.6. Monitoramento Qualidade da Água	21
	2.6.7. Manutenção Reserva Legal	22
3.	ORÇAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO 2021	24
4.	CÁLCULO DA TARIFA D'ÁGUA PARA O ANO 2021	
	4.1. Tarifa K2 Fixo	26
	4.2. Tarifa K2 Variável	
	4.2.1. Sistema Principal	27
	4.2.2. Sistema Secundário	
	4.2.3. Área F	
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
6	ANEXOS	30


### 1. APRESENTAÇÃO

O Distrito, ao apresentar este plano, o faz demonstrando a realidade das atividades de Administração, Operação e Manutenção desenvolvidas na infraestrutura hidráulica de uso comum do Perímetro de Irrigação Jaíba – Etapa I.

As diretrizes do Conselho de Administração são marcadas pelo aprimoramento na gestão e um planejamento anual que resulte na transparência e eficiência dos serviços prestados. Dessa forma, estaremos implementando ações que garantam o fornecimento de água para irrigação das culturas dos produtores associados Etapa I e os irrigantes da Etapa II, os quais são atendidos pela infraestrutura hidráulica do Projeto Jaíba.

### 2. PANORAMA GERAL DO ANO ANTERIOR



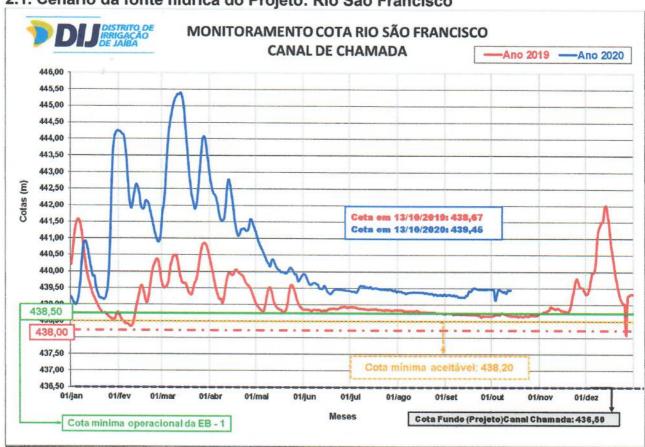

O gráfico acima demonstra uma expressiva evolução nas cotas operacionais dos níveis de captação na estação EB1 em relação ao ano de 2019. Este avanço se deve em função do período chuvoso favorável e modelo de gestão aplicado na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco sob a coordenação da Agência Nacional de Águas – ANA, no qual os Distritos de Irrigação participam deste fórum de decisão das defluências de vazões das principais Usinas Hidrelétricas: Três Marias e Sobradinho.



### 2.2. Ocupação

Na gleba C2 (área empresarial) existem 16 (dezesseis) lotes agrícolas que foram assentados pela CODEVASF(entre 1996 à 2000), ou seja, já se passaram mais de 20 anos e os proprietários nunca solicitaram o pedido de água para irrigação. A área total desses referidos lotes somam 549 ha(sem exploração agrícola), acumulando débito de tarifa de água K2 fixo, junto ao Distrito, no valor de R\$ 1.022.533,49.


### Lotes retomados

A ação conjunta realizada pelas empreendedoras do Projeto Jaíba, <u>CODEVASF</u> e a extinta <u>RURALMINAS</u>, referente a retomada de 25 lotes agrícolas da categoria de pequeno Produtor, os quais foram comprovados situação de inexplorados e abandonados pelos seus ocupantes anteriores resultou na publicação "*Diário Oficial da União no 148 de 4 de agosto de 2010/Edital de Reincorporação de Posse*" ao patrimônio das referidas entidades. Até a presente data, passados 10 anos, dos referidos lotes, 24 ainda continuam inativos (inexplorados). O débito acumulado desses Lotes, referente a tarifa de água K2 fixo junto ao Distrito, período de 2011 à setembro de 2020, é de R\$ 231.308,66.

O fato do Distrito faturar e não receber contas de água K2fixo dos Lotes agrícolas, acima mencionados, compromete a sustentabilidade econômica—financeira da Associação DIJ para garantir serviços de qualidade na Operação e Manutenção das infraestruturas de Irrigação de uso comum do Projeto. É importante destacar que as providências de ocupação destes lotes não é de responsabilidade do Distrito.

### 2.3. Gráfico Volume Fornecido de Água para Irrigação

Volume Fornecido (m³) Etapas I e II Cenário 2020 em relação a 2019

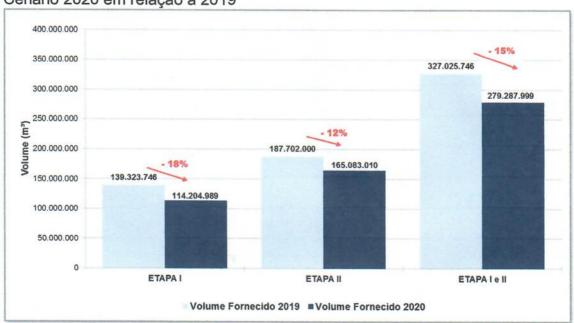

Nota: Volume efetivo de Jan a Set, sendo projeção de Out a Dez/20

O volume de água fornecido para irrigação em 2020 apresenta uma queda de 15% em relação ao ano de 2019. Os fatores que influenciaram nesse declínio podemos atribuir ao clima mais favorável(período chuvoso mais prolongado e temperaturas mais amenas) e também a crise da saúde/Pandemia do vírus Covid-19 que agregou incertezas econômicas

regional e mundial, consequentemente retraiu investimentos nas áreas irrigáveis do Perímetro.

### 2.4. Inadimplência

Com relação a participação financeira das Etapas III e IV, nos custos de Operação e Manutenção da Infraestrutura do Sistema Principal, é importante destacar que do valor faturado no ano, no montante de R\$ 625.603,23, o DIJ recebeu, de fato, até o dia 14/10/2020, somente a contribuição da SADA Bioenergia referente área ocupada e explorada de 1.739,77 na Etapa III, no valor de R\$ 76.723,83. Portanto, o DIJ tem a receber da CODEVASF o valor de R\$ 548.879,40.

Este cenário de inadimplência impacta no comportamento das metas de trabalho previsto no Plano Operativo deste ano de 2020 e compromete, ainda, a continuidade da qualidade dos serviços de manutenção do Sistema Principal.

A planilha a seguir ilustra a performance do processo de faturamento e recebimento de água K2 ano 2020.



# Inadimplência - Planilha de Faturamento e Recebimento - Ano 2020

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total	%
1. Faturamento água até setembro/2020	té setembro/2020										
Tarifa K2 fixo	695,553,87	695.553,87	695.553,87	695.553,87	695.553,85	695.553,85	695.553,87	695.553,85	695.430,55	6.259.861,45	
Etapa I	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.588,05	531.464,75	4.784.169,15	
Etapa II	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	850.089,15	
Etapa III	40.114,77	40.114,77	40.114,77	40.114,77	40.114,75	40.114,75	40.114,77	40.114,75	40.114,75	361.032,85	
Etapa IV	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	264.570,30	
Tarifa K2 variável	633.814,95	455.188,40	361.507,95	452.134,74	700.851,45	727.312,85	792.181,20	822.484,70	953.638,30	5.899.114,54	
Etapai	319.274,40	181.339,05	159.053,15	181.429,70	324.927,30	371.618,70	414.523,05	432.966,00	526.942,60	2.912.073,95	
Etapa II	314.540,55	273.849,35	202.454,80	270.705,04	375.924,15	355.694,15	377.658,15	389.518,70	426.695,70	2.987.040,59	
										1	
Bandeira Tarifária	30.373,30					,				30.373,30	
Etapa I	14.323,05		,							14.323,05	
Etapa II	16.050,25									16.050,25	
TOTALFATURADO	1.359.742.12	1.150,742.27	1.057.061.82	1.147.688,61	1.396.405,30	1.422.866,70	1.487.735,07	1.518.038,55	1.649.068,85	12,189,349,29	

Tarifa K2 fixo	508.185,90	504.811,75	503.922,59	498.124,07	486,668,35	473.124,15	410.381,21	368.218,40	317,336,40	4.070.772,82	65%
% Recebimento k2 fixo	73%	73%	72%	72%	20%	%89	%65	23%	46%	%59	
Etapa I	405.206,68	401.832,53	400.943,37	395.144,85	383.689,15	370.144,95	307.401,99	265.239,20	214.357,20	3.143.959,92	%99
	76,2%	75,6%	75,4%	74,3%	72,2%	%9'69	22,8%	49,9%	40,3%	65,7%	
Etapa II	94.454,35	94.454,35	94,454,35	94.454,35	94,454,35	94,454,35	94.454,35	94.454,35	94.454,35	850.089,15	100%
Etapa III	8.524,87	8.524,87	8.524,87	8.524,87	8.524,85	8.524,85	8.524,87	8.524,85	8.524,85	76.723,75	21%
Etapa IV		1						1			%0
Tarifa K2 variável	601.657,73	438.522,95	346.525,43	429.008,39	649.727,67	647.197,40	648.129,87	614.660,60	633.704,90	5.009.134,94	85%
Etapa I	287.117,18	164.673,60	144.070,63	158.303,35	273.803,52	291.503,25	270.471,72	225.141,90	207.009,20	2.022.094,35	69%
Etapa II	314.540,55	273.849,35	202.454,80	270.705,04	375.924,15	355.694,15	377.658,15	389.518,70	426.695,70	2.987.040,59	100%
Bandeira Tarifária											
Etapa I	12.524,25									12.524,25	87%
Etapa II	16.050,25		-				,	1		16.050,25	100%
TOTAL RECEBIDO	1.138.418,13	943.334,70	850.448,02	927.132,46	1.136.396,02	1.120.321,55	1.058.511,08	982.879,00	951.041,30	9.108.482,26	75%
% Recebimento	0.40/	7000	200%	8467	840%	7007	7467	A550/L	7089	7697	

Tarifa K2 fixo	187.367,97	187.367,97 190.742,12 191.631,28	191.631,28	197.429,80	208.885,50	222.429,70	285.172,66	327.335,45	378.094,15	2.189.088,63	35%
Etapa I	126.381,37	129.755,52	130.644,68	136.443,20	147.898,90	161.443,10	224.186,06	266.348,85	317.107,55	1.640.209,23	34%
Etapa II										-	%0
Etapa III	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	31.589,90	284.309,10	79%
Etapa IV	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	29.396,70	264.570,30	100%
Tarifa K2 variável	33.956.02	16.665.45	14.982.52	23.126.35	51.123.78	80.115.45	144.051.33	207.824.10	319.933.40	891.778.40	15%
Etapa I	32.157,22	16.665,45	14.982,52	23.126,35	51.123,78	80.115,45	144.051,33	207.824,10	319.933,40	889.979,60	31%
Etapa II	1	1		,	1		1				%0
Bandeira Tarifária											
Etapa I	1.798,80									1.798,80	13%
Etapa II		1		,	,	,	1				%0

TOTAL ARECEBER 221.323,99 207.407,57 206.613,80 220.556,15 260.009,28 302.545,15 429.223,99 535.159,65 698.027,55 3.080.867,03 25%

### 2.5. Plano Operativo 2020 – Planejado X Realizado Período: Jan a Set/2020

		Total Previsão	Total Realizado	Total diferença
tipo	custo			
= Energia	Energia	6.548.274,10	5.280.511,25	-19,369
	Outorga/Monit. Recursos Hidr	573.214,15	371.779,78	-35,14%
	Energia comportas/C2	-	26.020,52	0,00%
Energia Total		7.121.488,25	5.678.311,55	-20,27%
= Pessoal	Salário base	632.489,91	645.220,22	2,019
	Encargos sociais e trabalhistas	463.918,70	471.591,46	1,65%
	Cesta básica	57.645,00	65.988,00	14,479
Pessoal Total		1.154.053,61	1.182.799,68	2,49%
= Manutenção Direta Infraestrutura	Canal/Predial/Estrada	378.998,71	295.290,77	-22,09%
	Equipe Técnica	301.153,35	293.720,62	-2,47%
	Manutenção Elétrica	481.495,24	431.997,87	-10,28%
	Manutenção Mecânica	439.057,40	328.289,95	-25,23%
	Material Máqu/Veículos	885.855,99	905.854,54	2,26%
	Meio ambiente	46.907,72	51.572,71	9,95%
Manutenção Direta Infraestrutura To	tal	2.533.468,41	2.306.726,46	-8,95%
= Serviços Terceirizados	Canais	395.779,77	220.751,08	-44,22%
	Estradas	-	-	0,00%
	Manutenção Predial	19.963,31	2.050,00	-89,73%
	Manutenção Elétrica	299.178,57	117.660,19	-60,67%
	Meio ambiente	14.000,00	14.000,00	0,00%
Serviços Terceirizados Total		728.921,64	354.461,27	-51,37%
- Administrativas Gerais	Administrativos Gerais	466.374,96	481.296,96	3,20%
	Rateio Pessoal Administração	576.712,73	555.738,66	-3,64%
Administrativas Gerais Total		1.043.087,69	1.037.035,62	-0,58%
- Investimentos	Investimentos	45.000,00		-100,00%
Investimentos Total		45.000,00		-100,00%
Total Geral		12.626.019,60	10.559.334,58	-16,4%



### 2.6. Manutenção da Infraestrutura de Uso Comum

### 2.6.1. Manutenção Eletromecânica

A manutenção e conservação da infraestrutura hidro-eletro-mecânica foi exercida dentro da normalidade técnica que requer o setor. Os Planos de Manutenções Preventivas estão sendo seguidos conforme as periodicidades específicas para cada grupo de equipamentos instalados, tais como:

Subestação Elétricas (Alta e média tensão), Transformadores, Painéis Elétricos, Conjuntos Motobombas, Sistema de Automação, Sistemas Hidráulicos, Adutoras de Recalque, Válvulas, Pontes Rolantes, comportas, etc.

As intervenções corretivas, também foram realizadas em tempo hábil. Não havendo portanto registros operacionais de comprometimento no fornecimento de água para irrigação dos Lotes agrícolas.

### 2.6.1.1. Manutenção Elétrica

Atividades dos trabalhos de manutenções relevantes nas instalações elétricas de uso comum: <u>Subestações</u>, Conjuntos Motobombas e Painéis Elétricos:



Manutenção elétrica na galeria dos Motores 1700 Hp da Estação EB1



Manutenção preventiva nos Disjuntores 6,6 kv na sala dos paineis estação EB2



Manutenção corretiva nos componentes do sistema de levatamento de escovas do motor 1850 cv da Estação EB-2






Manutenção nos Transformadores da Subestação Elétrica 138 kv da EB-1

Testes/start up novo Painel Motor 03 1700 hp – Estação EB-1



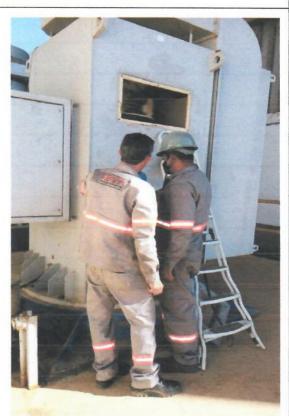

Inspeção nos motores elétricos para detectar ruído magnético – Estação ER-C2



### 2.6.1.2 Manutenção Mecânica





Manutenção preventiva e corretiva: bomba vertical de vazão 3,0 m³/s da estação ER-C2





Retirada de Bomba Submersível para Manutenção preventiva - Estação ER-B



### 2.6.2. Manutenção de Canais


### 2.6.2.1 Desassoreamento

Gleba	Realizado (m)	Ext. Total (m) Canais	% Realiz
A	5.670,00	66.498,47	8,53%
В	14.600,32	28.987,86	50,37%
C2	1.110,00	76.263,30	1,46%
C3	1.800,00	5.009,87	35,93%
D	6.996,60	27.148,75	25,77%
F	0,00	5.611,70	0,00%
CP (*)	0,00	20.656,90	0,00%
Total	30.176,92	230.176,85	14,40%

### Realizado até 10/10/2020:

Extensão Realizada = 30.176,92 m

Percentual em relação ao total de canais = 14,40%









Canal L.9


### 2.6.2.2. Roçagem de Vegetação

Gleba	Realizado (m)	Ext. Total (m) Canais	% Realiz
A	132.996,94	66.498,47	200,00%
В	57.975,72	28.987,86	200,00%
C2	107.235,55	76.263,30	140,61%
C3	5.009,87	5.009,87	100,00%
D	27.505,45	27.505,45	100,00%
F	11.223,40	5.611,70	200,00%
CP	34.126,90	20.656,90	165,21%
Total	376.073,83	230.533,55	163,13%

### Realizado até 10/10/2020:

Extensão Realizada = 376.073,83 m

Percentual em relação ao total de canais = 163,13%





Canal CP/A2



Canal CP/B





Canal CP-2

Canal L.8

### 2.6.2.3. Recuperação de Juntas e Substituição de Placas

MANUTANÇÃO DE CANAIS	UNID	PLANEJADO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Recuperação de Juntas	m	15.200,00	9.500,00	62,5%
Substituição de Placas	m <sup>3</sup>	26,00	26,00	100,0%





62,5%

100,0%







Canal CS-16/C2









Canal CS-12/B



Canal CS-21/B



Canal CT8-S6/A4

### Serviço Contratado: (Contrato nº CTO-2020-002-00-00)

- Substituição ou execução de juntas: Extensão = 9.500,00 m
- Substituição ou execução de placas de concreto:
   Volume = 26,00 m³

Empresa: **TF ENGENHARIA E ECONOMIA LTDA ME**, com sede na Rua Eloi de Oliveira, 301 - Sala 105 – Centro - Jaíba/MG - CEP: 39.508-000, CNPJ/MF nº 24.013.789/0001-83.

Contrato assinado em: 07/08/2020

Situação atual: Em execução os serviços de substituição de juntas e placas de concreto.

### 2.6.2.4. Gleba D / Mocaminho (Ações de Controle Operacional Fornecimento de Água)

Melhoramentos realizados, pelo Distrito, na infraestrutura hidráulica de distribuição de água para irrigação dos lotes agrícolas objetivando redução de perdas operacionais:

- ✓ Muretas laterais nos canais;
- ✓ Execução de novas estruturas de captação;
- ✓ Execução de descargas
- ✓ Eliminação de canais com a implantação de tubulações;
- ✓ Novas tomadas de alimentação para os lotes agrícolas;
- ✓ Pontes de acesso a lotes



Execução de mureta no canal L.5



Juntas na captação unid. bombeamento



Proteção de tomada d'água canal L.5



Reforço em paredes de reservatório (Lote 47 Gleba D)

### 2.6.2.5. Atividades Diversas de Manutenção civil



Recuperação placas de concreto: aplicação de pasta "cimento+água+adesivo" estrutural (canal CS-1/F – trecho na captação EB-1/F)



Recuperação placas de concreto: aplicação de pasta "cimento+água+adesivo" estrutural (canal CS-1/F – trecho na captação EB-1/F)



Manutenção rede distribuição pressurização coletiva Gleba F(Substituição de tubos)



Manutenção rede distribuição pressurização coletiva Gleba F(Substituição de tubos)



Limpeza e desassoreamento de drenos (Glebas F)



Limpeza e desassoreamento de drenos (Glebas F)



Pintura e sinalização de galerias nas redes Canais



Pintura e sinalização de galerias nas redes Canais



Roçagem vegetação sifão C3/C1-C4



Roçagem vegetação sifão C3/C1-C4

### 2.6.3. Manutenção de Comportas

### 2.6.3.1 Recuperação de Cercas (Limpeza)

MANUTENÇÃO DE COMPORTAS	UNID	PLANEJADO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Manutenção de Comportas	unid	35,00	35,00	100,0%







### 2.6.4. Manutenção Predial

Limpeza do Pátio, Recuperação de Cercas e Portões, Pintura, Recuperação Instalações Sanitárias

MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO	UNID	LIMPEZA DO PÁTIO	RECUPERAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES	PINTURAS	RECUPERAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Estação EB-1	unid	100,0%	100,0%	15,0%	50,0%
Estação EB-2	unid	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estação ER-CP/A4	unid	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Estação ER/B	unid	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Estação ER/C2	unid	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Estação ER-CP/C2	unid	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Estação ER/C3	unid	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
Estação EB's Gleba F	unid	100,0%	100,0%	10,0%	25,0%



EB-1 (Substituição parcial de piso interno)



EB-1 (Substituição parcial de piso interno)



EB-1 (Pintura parcial nas instalações internas)



EB-1 (Pintura parcial nas instalações internas)



EB-1 (Pintura parcial nas instalações internas)



EB-1 (Pintura parcial nas instalações interna)



Estação ER/C2 : limpeza pátio externo



Estação ER/C2 : limpeza pátio externo



ER/C2 (Instalação de novas tubulações enterradas e caixas de passagem p/ sensores de nível).



ER/C2 : Instalação de novas tubulações enterradas e caixas de passagem p/ sensores de nível.


### 2.6.5. Regularização de estradas

Gleba	Tota	al Estradas (	km)	Total Estra	adas Realiz	adas (km)	Estrad	as Realizad	las (%)
	Serviço	O&M	Total	Serviço	O&M	Total	Serviço	M&O	Total
Α	68,24	83,39	151,63	31,59	7,54	39,13	46%	9%	26%
В	37,14	40,54	77,68	9,04	2,66	11,70	24%	7%	15%
C2	80,33	77,68	158,01	64,27	28,66	92,93	80%	37%	59%
C3	6,81	7,62	14,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
D	18,63	35,33	53,96	4,75	0,00	4,75	25%	0%	9%
F	74,24	5,61	79,86	28,94	2,67	31,61	39%	48%	40%
CP	0,00	35,96	35,96	0,00	1,35	1,35	0%	4%	4%
Total	285,39	286,13	571,53	138,59	42,88	181,47	49%	15%	32%

### Realizado até 10/10/2020:

Extensão Realizada = 181,47 km (15.000 m³ cascalho extraídos/aplicados)

Percentual em relação ao total de estradas = 32%





Cascalheira :Retirada de terra sobre o cascalho



Cascalheira: Extração



Manutenção Estrada CS-14/C2



Manutenção Estrada CS-11/C2



Manutenção Estrada CT8-S6/A4



Manutenção Estrada E7/A



Manutenção Estrada CP/C2 (Roçagem)



Manutenção Estrada CP/A2 (Roçagem)

### 2.6.6. Monitoramento da Qualidade de Água

Serviço Contratado: (Contrato nº CTO-2020-003-00-00)
Serviços de avaliação da qualidade da água e sedimentos no âmbito do Perímetro de Irrigação Jaíba, em 32 parâmetros a serem analisados

Empresa: LAAE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES LTDA, com sede na Av. Professor Vicente Guimarães, nº 510, bairro Morada do Sol, CEP: 39.403-410, Montes Claros/MG, CNPJ: 05.551.514/0001-59

Contrato assinado em: 24/08/2020

Campanhas: 1ª Campanha: Período = Coleta realizada em Out/2020

2ª Campanha: Período = Previsão de início de coleta em Março/2021

Situação atual Contrato: Em andamento.







Coleta em poço tubular



### 2.6.7. Manutenção Reserva Legal

### 2.6.7.1. Execução de Aceiramento na Reserva Legal (Perímetro = 46 km)



### 2.6.7.2. Execução de recuperação da Casa 1 – vigilância da reserva:

Serviços: Recuperação das instalações prediais e pátio da Casa 1 do vigia da reserva.





Limpeza da área da casa 1





Recuperação da Casa 1 (Pintura)





Recuperação bacia água animais

Recuperação bacia água animais

775.247,10

61.853,92

33.000,00

40.499,04 15.576,56 11.571,16 109.781,34 23.444,15 12.376,11 213.248,35

3.374,92 1.298,05 964,26 9.148,44 1.953,68 1.031,34 17.770,70

40.499 15.577 11.571 109.781 23.444 12.376

0,70% 0,70% 1,30% 0,30% 3,00%

5.785.578 2.225.222 890.089 36.593.779 7.814.716

verba verba verba

2.4 Manutenção Elétrica
2.4.1 Sistema de automação sistema principal
2.4.2 Sistema de automação sistema Secundário
2.4.3 Sistema de automação sistema Área F
2.4.4 Material manutenção elétrica sistema principal
2.4.5 Material manutenção elétrica sistema secundário

2.4.6 Material manutenção elétrica área f 2.4.7 Total de Manutenção Elétrica

412.537

verba

verba

verba



# 3. ORCAMENTO DAS ATIVIDADES PARA O ANO 2021

Descrição	Dun	Otde	Custo Me	Custo Médio p/ Func	Custo Mensal	Participação	Custo Total Anual
Administração	Func	10		6.640,51	66.405,06	17%	796.860,78
Equipe Técnica*	Func	m		11.802,82	35.408,46	%6	424.901,53
Canais e obras civis	Func	D.		3.815,27	19.076,34	2%	228.916,06
Manutenção Elétrica	Func	4		9.118,51	36.474,05	40%	437.688,60
Manutenção Mecânica	Func	4		5.291,33	21.165,31	%9	253.983,69
Patrulha Mecanizada	Func	11		4.258,67	46.845,40	12%	562.144,84
Sistema Principal	Func	17		4.149,68	70.544,59	461	846.535,11
Sistema Secundário	Func	14		4.155,46	58.176,39	15%	698.116,68
Área F	Func	Ω.		4.109,17	20.545,87	2%	246.550,41
Meio Ambiente	Func	2		2.773,00	5.546,01	1%	66.552,08
Total Custo de Pessoal		75		5.069,17	380.187,48	400%	4.562.249,78
2. Custo de Material Manutenção							
Descrição	Cnd	Otde Existente	% Recuperar	Otde Recuperar Custo Unitário	Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
2.1 Manutenção de canais Pequeno e médio porte							
2.1.1 Recuperação de juntas	E	431.101	3,71%	16.000	11,30	15.062,01	180.744,09
2.1.2 Substituição de placas	m3	85.763	0,01%	0	309,19	220,98	2.651,71
2.1.3 Recuperação estrutura hidráulica	pun	2.307	1,50%	35	1.016,99	2.932,74	35.192,87
2.1.4 Total de Manutenção de canais						18.215,72	218.588,67
2.2 Manutenção Predial							
2.2.1 Sistema Principal	m <sup>2</sup>	2.500	2,00%	90	124,50	518,76	6.225,15
2.2.2 Sistema Secundário	m <sup>2</sup>	1.700	8,00%	136	124,50	1.411,03	16.932,41
2.2.3 Area F	m <sup>2</sup>	920	15,00%	138	124,50	1.431,78	17.181,42
2.2.4 Total de Manutenção predial		5.120		324		3.361,58	40.338,98
2.3 Manutenção Hidromecânica							
2.3.1 Prolongamento Canais Tubulação (PEAD) SS	Ε	22.221	%05'0	111	198,71	1.839,82	22.077,87
2.3.2 Tomadas Parcelares Secundário (registro e aces)	pun	3.656	1,50%	55	501,42	2.291,49	27.497,83
2.3.3 Tomadas Parcelares Area F	pun	1.304	1,50%	20	609,24	70,599,07	11.916,80
2.3.4 Tubulação Hidráulica Área F	E	58.232	0,30%	175	161,11	2.345,49	28.145,91
2.3.5 Manutenção Bombas Sistema Principal	verba	52.276.828	0,25%			10.891,01	130.692,07
2.3.6 Manutenção Bombas Sistema Secundário	verba	7.814.716	0,45%			2.735,15	32.821,81
2.3.7 Manutenção Bombas Área F	verba	563.960	3,00%			1.409,90	16.918,81
2.3.8 Total de Manutenção Hidromecânica						22.505,92	270.071,09
			-		_		

0

2.6 Total de custo com material de manutenção

2.5.2 Total de Manutenção Estradas

2.5 Manutenção Estradas 2.5.1 Material Manutenção Estradas

3	M	
S C C	DE JA	
		١
	NICIO I	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3.1 Estradas         km           3.2 Desassoreamento canal chamada         verba           3.2 Construções civis         m           Recuperação cercas         m           Impaire desaggas         m           Pintura estações         m           Reformas/Adequações         m           3.4 man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Sistema Principal         verba           3.5 man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Sistema Secundário         verba           3.6 man. sub. Elétricas, Painéis e Motores Area F         verba           3.6 man. reserva legal/campanha socioeducativa         verba           3.7 man. elétrica motores, Circuito de Força, Com Sistema Principal         verba           3.8 man. reserva legal/campanha socioeducativa         verba           3.9 Monitoramento recursos hidricos         verba           3.10 Gestão ambiental         verba           3.12 Recuperação de Juntas canal de grande porte         m           3.13 Recuperação canal de grande porte         m           3.15 Substituição de placas canalis de pequeno porte         m           3.15 Substituição de placas canalis         m           3.15 Recuperação canal se pequeno canals         m           3.15 Recuperação de placas canalis         m           3.15 Recuperação estruturas hidráulicas (co	431.101 431.101 5.500 7.900 3.820 3.820 3.820 3.820	32,58% 43,64% 95,95% 3,14%	10.100	,	8.333,33	
S constituções civis se recuperação cercas Limpeza de pátio percasa Limpeza de pátio encras Adequações Reforma sAdequações Reforma sAdequações Paineis e Motores Sistema Principal 1 man. Sub. Elétricas, Paineis e Motores Sistema Principal 5 man. Sub. Elétricas, Paineis e Motores Sistema Principal 7 man. elétrica motores, Circuito de Força, Com Sistema Principal 8 man. reserva legalicampanha socioeducativa 9 Monitoramento recursos hídricos 10 Gestão ambiental 10 Desas socioeducativa 11 Desas socioeducativa 12 Recuperação de Juntas canal de grande porte 12 Recuperação canal de grande porte 13 Recuperação canal de grande porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte 15 Substituição de placas canalis de paga 15 Substituição de placas canalis de placas cana	431.101 85.763 7.900 3.620 3.620 3.620 3.620	43.64% 95.95% 3.14%	10.100		8.333,33	
Recuperação cercas Limpeza de pático Pintura estações Reformas/Adequações Reformas motores, Circuito de Força, Com Sistema Principal Reserva legal/Campanha socioeducativa Monitoramento recursos hídricos ID Gestão ambiental ID Desas sorramento de canal de grande porte I2 Recuperação de Juntas canal de pequeno porte I3 Recuperação canal de grande porte I4 Roçagem vegetação canais de pequeno e médio porte I5 Substituição de placas canalis de pequeno e médio porte	17.230 5.600 7.900 3.820 3.820 3.820 3.820	43.64% 95.95% 3.14%	10.100			100.000,00
Recuperação cercas Limpeza de pátio Pintura estações Reformas/Adequações I man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Sistema Principal man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Sistema Principal man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Sistema Principal man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Area F 7 man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Area F 8 man. Sub. Elétricas, Painéis e Motores Area F 9 man. elétrica motores, Circuito de Força, Com Sistema Principal 8 man. reserva legal/campanha socioeducativa 9 Monitoramento recursos hidricos 10 Gestão ambiental 11 Desassosoreamento de canal de grande porte 12 Recuperação de Juntas canal de pequeno porte 13 Recuperação canal de grande porte 14 Roçagem vegetação canals 15 Substituição de placas canals 15 Substituição de placas canals 16 Substituição de placas canals 16 Recuperação estruturas hidráulicas (comportas, tomadas parc.)	85.763 85.763 209.470	43.64% 95.95% 3,14%			2.341,01	28.092,18
<u></u>	7.900 3.820 3.820 431.101 85.763	95,95%	2.400		290,08	3.480,96
<u></u>	3.820 431.101 85.763 85.763	3,14%	7.580		621,25	7.455,06
<u></u>	431.101 - 85.763 209.470		120		207,20	2.486,40
<u></u>	431.101 85.763 209.470				1.222,48	14.669,76
	85.763 209.470				28.031,25	336.375,00
<u></u>	431.101 85.763 85.763				1.552,50	18.630,00
<u></u>	431.101 - 85.763 209.470				3.105,00	37.260,00
	431.101 85.763 209.470				1 742 25	20 907 00
	85.763 209.470					1
	85.763 209.470					1
1	431.101 - 85.763 209.470				1	4
	85,763 209,470	3,53%	15.200	9,53	12.076,88	144.922,50
1	85,763					1
<u></u>	85.763	2,29	541.193		25.304,20	303.650,42
\ \!\!	209.470	0,03%	26	320,00	686,11	8.233,27
	209.470				6.044,40	72.532,80
-	1 1	%00'0				
no, médio e grande port	1	100,00%	236.379	0,05		11.818,93
			-	-	1040	24 040 00
	The second secon			The second secon	4 725 00	20,000,000
3.21 Manut. sistema automação sistema Secundario Verba	-				1 026 00	12 420 00
3.22 Manut. sistema automação Sistema Area F					00,000,0	2.420,00
3.23 Total de custo com servicos terceirizados					96.905,45	1.146.592,10
A Company of the Comp						
e vercuros				-		
Descrição	Otde Existente	% Recuperar	Otde Recuperar	r Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
4.1 Patrulha Mecanizada	19			26.848,11	42.062,04	504.744,47
	2			20.339,93	3.389,99	40.679,87
	2			11.672,69	1.945,45	23.345,39
4.4 Veículos Manutenção Mecânica veículos	-			16.180,26	1.618,03	19.416,31
	14			6,135,95	1986.7	47 442 60
	200			5 644 63	060,000	11 620 05
4.7 Veiculo Intelo Ambiente (motocicletas)	*			0.014,00	60,606	00000
4.8 Total de custo c/ manutencão mág./velculos	43				58.596,83	703.162,01
E Danman Administration County						1
Despesas Administrativas Gerais				_		
Descrição	Otde Existente	% Recuperar	Otde Recuperar	Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
5.1 Despesas administrativas					51.112,77	613.353,28
		-				00 000 68
5.Z investimentos						25.000,00
6. Total Custo OP&M - Fixo					656.883,69	7.882.604,27
7. Custo de Energia, Outorga e Monit	_			-		
Descrição Und O	Otde Existente	% Recuperar	Otde Recuperar	Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
7.1 EB1 Verba					228.946,45	2.747.357,45
					189.985,43	2.279.825,13
ema Secundário					97.179,45	1.166.153,44
					58.352,18	700.226,12
						821.027,10
7.6 Monitoramento recursos hídricos						45.000,00
7.7 Total Custo Energia - Variável					574.463,51	7.759.589,25

### 4 - CÁLCULO DA TARIFA DE ÁGUA PARA O ANO 2021

### 4.1. Tarifa K2 Fixo

DESCRIÇÃO	UND	SISTEMA PRINCIPAL	SISTEMA SECUNDÁRIO	ÁREA F	TOTAL	% Tota
1. Administração	R\$	691.787,27	759,106,65		1.450.893,92	16,
1.1. Rateio Custo Pessoal Almoxarifado	R\$	12.009,12	20.072,60	-	32.081,72	0,
1.2. Rateio Pessoal Administração	R\$	408.942,78	355.836,27		764.779,06	8,
1.3. Rateio Despesas Administrativas Gerais	R\$	270,835,36	383.197,79	-	654.033,15	7,
1.4. Investimentos Administração	R\$	-	-	-	-	-
2. Operação/Manutenção da Infraestrutura	R\$	2.307.249,82	3.664.737,17	459.723,35	6.431.710,35	74,
2.1. Custos diretos	149	2.301.249,02	3.004.131,11	409.123,35	0.431.710,30	14,
2.1.1 Custo Pessoal Direto	R\$	846.535,11	698.116,68	246.550,41	1.791.202,20	20,
2.1.2 Material de manutenção Diretos	R\$	290.197,60	381,939,29	103.110,20	775.247,10	8,
matereial man. Hidro-mecânica		130.692.07	82.397.50	56.981.52	270,071,09	3,
matereial man. Elétrica		150.280,38	39.020,70	23.947.26	213.248,35	2,
matereial man Canal		700.200,00	218.588,67	20.347,20	218.588,67	2.
matereial man. Predial		6.225,15	16.932,41	17.181,42	40.338,98	0
Material man, Estradas		3.000.00	25.000.00	5.000.00	33.000.00	0.
2.1.3 Manutenção Veículos Diretos	R\$	3.000,00	97.532,40	17.443,58	The second secon	1,
2.1.4 Serviços Terceiros Diretos	R\$	494.439,28	583.533,66		114.975,98 1.146.592,10	
manutenção canais secundários	1/2	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		68.619,16		13,
manutenção predial		19.244,28	514.842,90	7 070,74	541.157,92	6,
manutenção prediai manutenção elétrica/automação		7,770,00	8.453.76	11.868.42	28.092,18	0,
manutenção hidro-mecânica		367.425,00	39.330,00	49.680.00	456,435,00	5,
manutenção hidro-mecanica estradas		k **		-		-
		-	200020			-
manutenção reserva legal			20,907,00		20,907,00	0,
Manutenção Canal Chamada	R\$	100,000,00			100,000,00	1,
The second secon			-	-		-
2.1.5 Investimentos Diretos	R\$	30.000,00	28.000,00	24.000,00	82.000,00	0,
	R\$				-	-
2.1.6 Total Custos Diretos OP&M	R\$	1.661.172,00	1.789.122,03	459.723,35	3,910.017,37	45
2.2. Equipes Serviços e Apolo 2.2.1 Setor Elétrico Manutenção EB's	De	150 141 00	209 900 77		404 022 00	-
2.2.2 Setor Mecânico Manutenção EB's	R\$	152.141,22	308.892,77	-	461.033,99	5,
	R\$	174.976,00	98.424,00	-	273.400,00	3,
2.2.3 Estradas	R\$		22.891,61	-	22.891,61	0,
2.2.4 Canais/Obras Hidráulicas	R\$	20.602,45	185.422,01	-	206.024,46	2,
2.2.3 Obras Civis	R\$	•	-	-	-	-
2.2.4 Meio Ambiente	R\$		66.552,08	-	66.552,08	0,
2.2.5 Setor Patrulha Mecanizada	R\$	213.377,86	853.511,45	-	1.066.889,31	12,
2.2.6 Equipe Técnica	R\$	84.980,31	339.921,23	-	424.901,53	4,
2.2.7 Total Serviços/Apoio OP&M	R\$	646.077,83	1.875.615,14	•	2.521.692,97	29,
I. Sub-Total Custo Fixo (1+2)	R\$	2.999.037,09	4.423.843,83	459.723,35	7.882.604,27	90,
% Participação Sobre o Valor Total	%	38,05%	56,12%	5,83%	100,00%	
Resera Técnica/Custo Financ	50	284 242 45	200 200 27	00 100 00		
5. Inadimplência	R\$	254.918,15	309.669,07	32.180,63	596.767,86	6,
o. inadimpiencia	R\$	44.985,56	132.715,31	13.791,70	191.492,57	2,
5. Total Geral Custo Fixo (3+4)	R\$	3.298.940,80	4.866.228,21	505.695,68	8.670.864,70	100,
. 1000 00101 00000 1100 (0.4)	100	0.200.040,00	4.000.220,21	303.030,00	0.010.004,10	100
7. Valor Particip. Efetiva CODEVASF Etapas III e IV (1)		731.110,08				
3. Total Custo Fixo Etapas I, II e 1.739,77ha da III		2.567.830,72				
D. Área Irrigável Total	há	62,263,98	19.393,35	1.660,23	62.263,98	_
10. Area irrigável Etpas III e IV	há	20.194,23	79.000,00	1.000,25	02.200,00	
11. Tarifa K2 Fixo						
11.1. k2 Fixo Sistema Principal (etapas III e IV -						-
especificamente CODEVASF)	R\$/ha mes	3,02				
11.2K2 Fixo Sistema Principal (etapas I, II e	. sprind files	0,02				
1.739,77 ha da III )	R\$/ha mes	5,09	5,09	5,09		
11.3.K2 Fixo Específico Sistema Secundário	R\$/ha mes	-	8,46	-		
11.4. K2 Fixo Sistema Secundário (item						
1.Administração e item 2.2 serviços apoio)	R\$/ha mes		11,47	11,47		
ALE MOEL E. W. A. E.	R\$/ha mes			25,38		
11.5. K2 Fixo Específico Área F 11.6. K <sub>2</sub> - Fixo para 2021	Tranta mes			20,00	the same of the sa	

### Detalhamento composição reserva técnica, custo financeiro e inadimplência:

Sistema principal a. Reserva técnica custos fixos 6,00% 2,50% b. Custo financeiro custos fixos c. Inadimplência 1,50% Total sistema principal Sistema secundário 10,00% a. Reserva técnica custos fixos 4,50% b. Custo financeiro custos fixos 2,50% c. Inadimplência Total sistema secundário 3,00%

Nota: (1) Valor líquido anual considerado em função de tutela antecipada confirmada por sentença nos autos do processo nº 0000961.53.2014.4.01.3825. Valores sujeitos à modificação após Liquidação de Sentença.

### 4.2. Tarifa K2 Variável

### 4.2.1. Sistema Principal

### PARTICIPAÇÃO DA ETAPA I

Estação	Volume (m³)	Area Irrigada (ha)	K2V (R\$/mil m³)	K2D (R\$/ha/mês)	K2 Outorga e Monit. (R\$/mil m³)	Resultado K2V (R\$)	Resultado K2D (R\$)	Resultado K2 Outorga e Monit. (R\$)	RESULTADO PARTICIPAÇÃO TOTAL (R\$)
EB1	114.204.989	12.000	8,80	0,89	3,10	1.005.265,37	128.437,18	354.131,28	1.487.833,83
EB2	46.978.022	3.800	9,52	1,16	-	447.075,35	52.897,96	-	499.973,31
TOTAL-1						1.452.340,72	181.335,14	354.131,28	1.987.807,14
							MOM CHELA EX	A.D.A. I	DA 47 44 / 11 -

K2V CHEIA - ETAPA I

R\$ 17,41/mil m<sup>3</sup>

### PARTICIPAÇÃO DA ETAPA II

Estação	Volume (m³)	Area Irrigada (ha)	K2V (R\$/mil m <sup>a</sup> )	K2D (R\$/ha/mês)	K2 Outorga e Monit. (R\$/mil m³)	Resultado K2V (R\$)	Resultado K2D (R\$)	Resultado K2 Outorga e Monit. (R\$)	RESULTADO PARTICIPAÇÃO TOTAL (R\$)
EB1	165.083.010	15.000	8,80	0,89	3,10	1.453.108,42	160.546,48	511.895,82	2.125.550,73
EB2	165.083.010	15.000	9,52	1,16	-	1.571.044,09	208.807,74	-	1.779.851,82
TOTAL-2			18,32	2,05	3,10	3.024.152,51	369.354,22	511.895,82	3.905.402,55
						K2V DEMANDA	A - ETAPA II	R\$ 2,05	i/ha irrigada mês

K2V CONSUMO - ETAPA II R\$ 2,05/ha irrigada mes

K2V CONSUMO - ETAPA II R\$ 21,42/mil m³

TARIFA K2 VARIÁVEL SISTEMA PRINCIPAL - VIG. JAN/2021

Tarifa K2 Variável (cheia) Etapa I	R\$ 17,41/mil m <sup>3</sup>
Tarifa K2 Variável (demanda) Etapa II	R\$ 2,05/ha irrigada mês
Tarifa K2 Variável (consumo) Etapa II	R\$ 21,42/mil m <sup>3</sup>

### 4.2.2. Sistema Secundário

Especificação	UND	<b>2021</b> Vig. Janeiro/2021	
1 - Energia Elétrica Sistema Secundário	R\$	1.166.153,44	
1.1 - Demanda (kw)	R\$	308.388,97	
■ Horário Fora de Ponta	R\$	308.388,97	
■ Horário de Ponta	R\$		
1.2 - Consumo (kwh)	R\$	857.764,47	
■ Horário Fora de Ponta	R\$	844.500,42	
■ Horário de Ponta	R\$	13.264,05	
2 - Reserva Técnica - custos variáveis	R\$		
3 - Total Custos Variáveis	R\$	1.166.153,44	
4 - Volume a faturar	m³	102.224.218	
5 - K 2 variável Sist. Secundário	R\$/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11,41	

6 - K 2 variável Sist. Principal (Etapa I)	R\$/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17,41
--	------------------------------------	-------

7 - K 2 variável Etapa I (Soma 5+6)	R\$/10³m³	28,82

### 4.2.3. Sistema Área F

Especificação	UND	2021 Vig. Janeiro/2021
1 - Energia Elétrica Área F	R\$	700.226,12
1.1 - Demanda (kw)	R\$	204.608,66
■ Horário Fora de Ponta	R\$	204.608,66
■ Horário de Ponta	R\$	-
Volume Fornecido (diurno + noturno)	m³	12.005.549,26
Tarifa K2 Variável Demanda	R\$/mil m³	17,04
1.2 - Consumo (kwh)	R\$	495.617,47
Consumo Hora de Ponta	R\$	18.368,11
Volume Fornecido (diurno + noturno)		12.005.549,26
Tarifa K2 Variável Hora de Ponta	R\$/mil m³	1,53
Consumo Hora Fora de Ponta - Diurno	R\$	396.240,82
Volume Fornecido Diurno		4.174.809,70
Tarifa K2 Variável Hora de Ponta	R\$/mil m³	94,91
Consumo Hora Fora de Ponta - Noturno	R\$	81.008,55
Volume Fornecido Diurno		7.830.739,56
Tarifa K2 Variável Hora de Ponta	R\$/mil m³	10,34
2 - Reserva Técnica - custos variáveis (5%)	R\$	35.011,31
3 - Custos Variáveis	R\$	735.237,43
3.1 Tarifa K2 Variável Diurno		119,16
3.1 Tarifa K2 Variável Noturno		30,36
4 - K <sub>2</sub> variável Sist. Principal (Etapa I)	R\$/10³m³	17,41
5 - K <sub>2</sub> variável Área F - Diurno	R\$/10³m³	136,57
6 - K <sub>2</sub> variável Área F - Noturno	R\$/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,77



### 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Distrito utilizará este Plano Operativo Anual- 2021 como parâmetro e consulta ao longo do ano para cumprir sua missão, objetivo e o negócio da Administração, Operação e Manutenção do Perímetro de Irrigação Jaíba.

Dentre as atividades previstas no Plano Operativo para o Ano de 2021, vale destacar: a) Desassoreamento de 159.388 m de canais de pequenos e médio porte; b) Recuperação de 16.000 metros de juntas dos canais de pequeno e médio porte; c) Roçagem de 541.192,64 metros de vegetação em canais de pequeno, médio e grande porte; d) Combate a formigueiros em 100% dos canais de pequeno, médio e grande porte; e) regularização e encascalhamento pontual em 180 km de estradas; f) Serviços pontuais no Canal de Chamada no valor R\$ 100.000,00; g) materiais e contratação serviços terceirizados para manutenção hidroeletromecânica das estações de bombeamento e automação no valor R\$ 940.000,00; h) investimentos para fornecimento e instalação novo retificador/ carrregador industrial corrente contínua para Estação EB-2, Aquisição de 02 motocicletas para atendimento Operação e Manutenção nos trabalhos de distribuição de água para irrigação e Aquisição Bombas centrifuga para a Área F, no valor total de R\$ 82.000,00.

Marcos Braga Medrado Gerente Executivo - DIJ

### 6- ANEXOS

- 01 Arquivo eletrônico completo Planilhas Excel (via e-mail)
- 02 Necessidades melhorias na infraestrutura de irrigação de uso comum



# I - SISTEMA PRINCIPAL

Empreendedor do Proieto Jaíba	for do Projeto	ões adicionais Valor I visualização) (
-------------------------------	----------------	---

0

R\$ 4.350.000,00

Correção vazamento Canal Principal CP2

2

### Justificativas:

- Evitar perdas de água, manutenção evitar colapso ruptura nas placas de concreto
- Garantir o fornecimento de água para todo o Projeto




Aquisição e instalação novo Transformador 138kv/6,6 kv na Subestação EB1

02

## Justificativas:

- Falta instalação do 3º transformador previsto no projeto original
- Os TRAFOS existentes são do ano de 1979, portanto mais de 30 anos.
- Vida útil
- Risco de ocorrência de fadiga, causando perda total equipamento comprometimento fornecimento água para irrigação de todo o Projeto Jaíba



R\$ 1.450.000,00



IRITO DE INVESTIMENTOS NECESSÁR IGAÇÃO COMUM DO PROJETO

03

Revitalização Painéis Elétricos Motores 1700 HP da Estação EB1

## Justificativas:

- Painéis originais antigos fabricação 1979, mais de 30 anos de uso
  - Dificuldades aquisição peças de reposição p/ painéis elétricos antigos
- Painéis antigos não atende as normas atuais de segurança NR10



Necessita efetuar

levantamento de

custo

Necessita efetuar levantamento de

custo

Estudo e Projeto Executivo para nova configuração do Canal de Chamada da EB-1, incluindo aquisição de novas máquinas e equipamentos especiais para devidas manutenções periódicas de desassoreamento.

8

## Justificativas:

 Viabilizar atividades de manutenção mais viáveis e econômicas e que atenda às necessidades ambientais.







# II – SISTEMA SECUNDÁRIO

Valor Estimado (R\$)	R\$ 17.600.000,00	
Informações adicionais (Fotos visualização)		
Descrição dos Investimentos a cargo do Empreendedor do Projeto Jaíba	Revitalização / Adequação da Infraestrutura de distribuição de água da Gleba D (Mocambinho).	<ul> <li>Justificativas:</li> <li>Redução das perdas de água.</li> <li>Transformação do atual sistema para demanda livre.</li> <li>Confiabilidade e segurança no atendimento de água para irrigação aos lotes agrícolas.</li> </ul>
Item	20	



R\$ 1.035.000,00

Aquisição de tubulações de PVC (DEFoFo), para atender melhorar e modernizar rede de distribuição pressurizada da Gleba F (diâmetros 100, 150, 200, 250 e 300 mm).

8

## Justificativas:

 Melhorar eficiência na operação, distribuição de água e reduzir custos nas atividades de manutenção.



# INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO

COMUM DO PROJETO JÁBA (Sist. Principal e Secundário - Etapa I) ANEXO 02

03

Aquisição de novas bombas centrífugas para Gleba F, capacidade de 100 cv, quantidade 15 unidades

R\$ 300.000.00

## Justificativas:

- Vida útil
- Risco de ocorrência de fadiga, causando perda total equipamento comprometimento fornecimento água para irrigação;
  - Melhorar eficiência na operação, distribuição de água e reduzir custos nas atividades de manutenção.




R\$ 2.280.000,00

Readequação para 326 novas tomadas de água para os tubulações, conexões e peças existentes e construção lotes agrícolas da Gleba F, com a substituição das de nova caixa de abrigo.

9

## Justificativas:

Melhorar eficiência na operação, distribuição de água e reduzir custos nas atividades de manutenção.





05

Melhoramentos / Elevação de Greide e Revestimento de 300 km de estradas, inclusive execução de bueiros no Sistema Viário do Projeto Jaíba.

## Justificativas:

- Redução da formação de trechos intransitáveis nos períodos chuvosos.
- Melhoramento no pavimento (cascalho) com trafego mais suave, visando reduzir perdas no transporte dos produtos agrícolas.
- Drenagem de pontos de formação de erosões, com a conseqüente interrupção de tráfego.
  - comunidades rurais internas do Perímetro. Melhorar e Viabilizar acesso seguro às




R\$ 6.500.000,00

90

Asfaltamento de 35 km de estradas vicinais do Projeto Jaíba (Etapa I)

## Justificativas:

Viabilizar condições de segurança para tráfego dos caminhões no escoamento da produção agrícola, reduzindo perdas dos produtos agrícolas no transporte.



R\$ 43.500.000,00



R\$ 3.100.000,00

07

para operações de manutenção das estradas e sistema Estruturação através de máquinas e equipamentos de distribuição de água (canais), para a agricultura irrigada, agroindústria e consumo humano. 01 Escavadeira hidráulica "Longo Alcance" sobre esteiras; 02 Caminhões basculante cap. 15 m³, 3 eixos;

01 Caminhão Pipa; 01 Caminhão Guincho, 3 eixos; 01 Motoniveladora; 01 Rolo Compactador; 01 Britador móvel.

## Justificativas:

Melhorar eficiência nas atividades de manutenção da infraestrutura viária e distribuição de água.



